


# Travaux d'extension du Port de Plaisance de Guidel-Plages

## Réunion d'information aux plaisanciers


- Mairie de Guidel - 26 juillet 2014 -

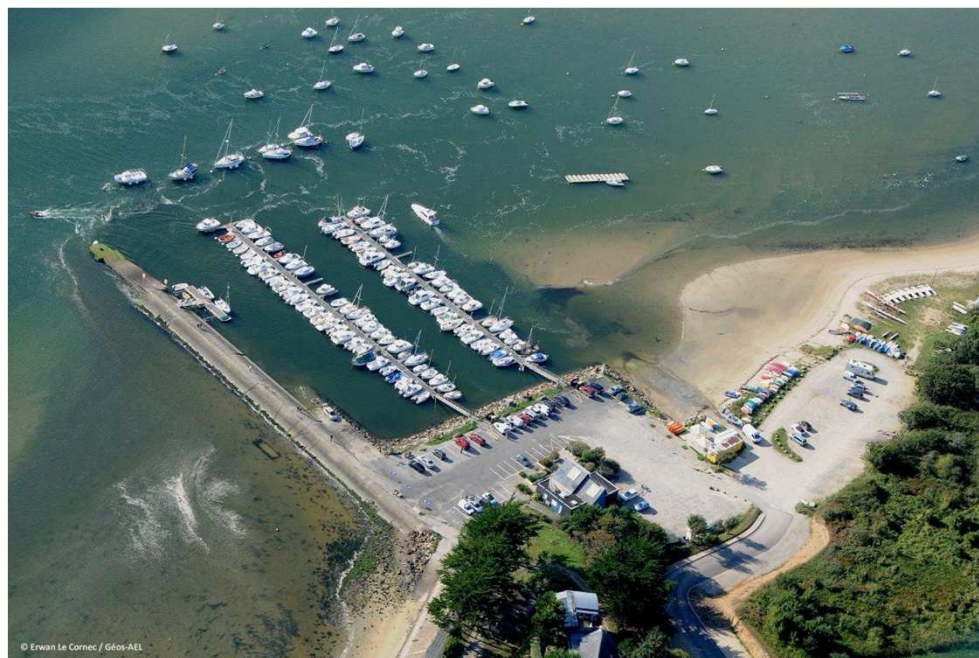

# Présentation des travaux :

## Éléments-clés :

- Souille à -1 CM
- Rideau d'enclôture (+4 CM), avec habillage bois
- Passe d'entrée de 30 m
- 5 pannes / 196 anneaux
- Rampes jet-ski
- Confortement du môle existant
- Montant des travaux : 3,5 M€HT

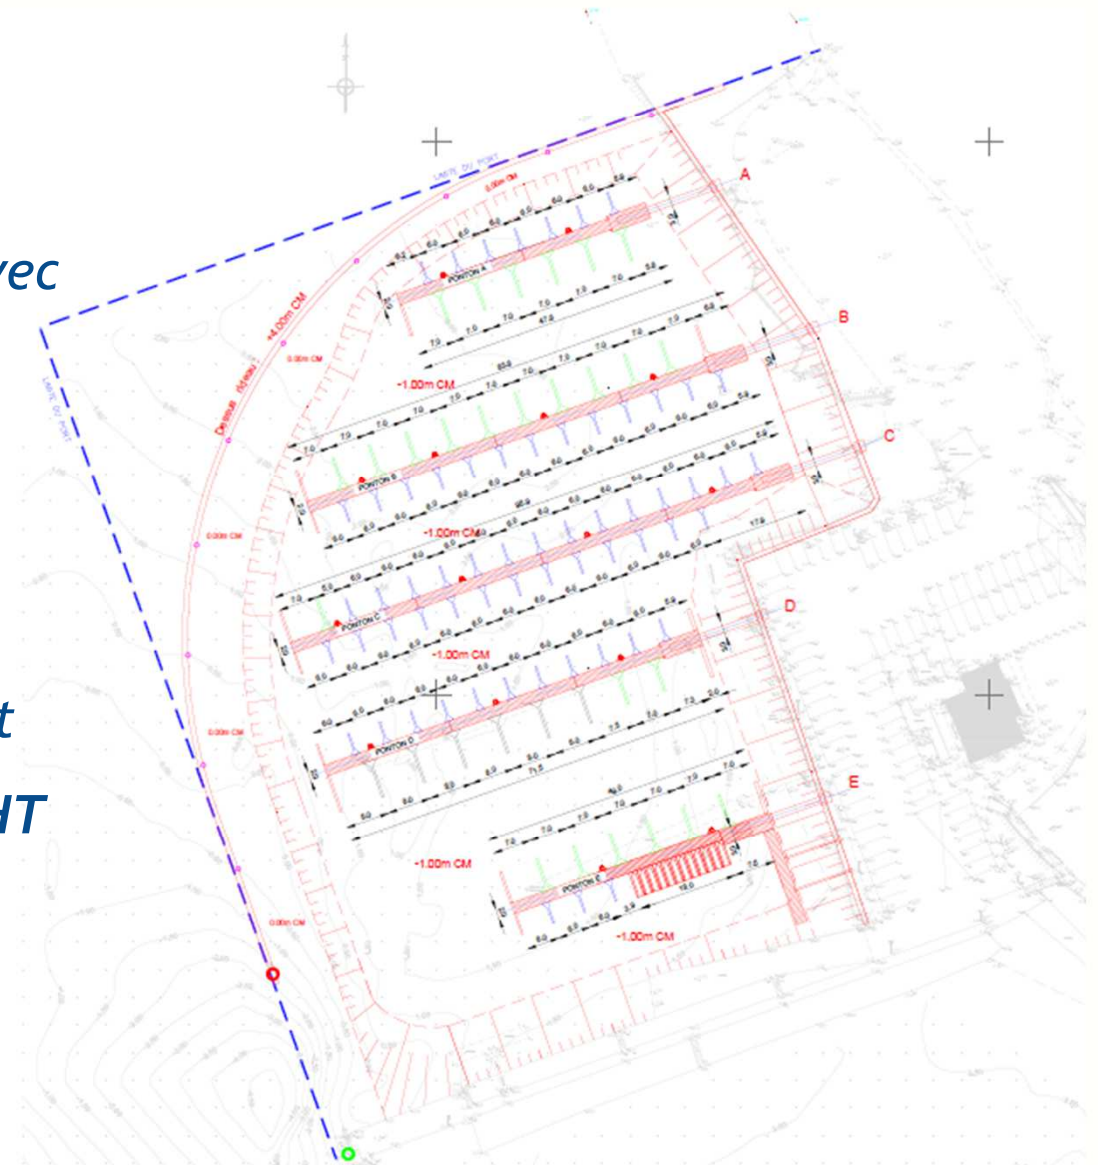

# Présentation des travaux :



(Basse mer de coef 45 ou mi-marée de coef 95) hauteur d'eau 2m au dessus du 0 cotes marines :  
rideau d'enclosure submersible visible sur 2m environ



(coef 95) hauteur d'eau : 5,15m au dessus du 0 cotes marines - rideau d'enclosure submersible invisible.

## Présentation des travaux :

### *Autorisations administratives (Code de l'Environnement):*

- Arrêté Inter Préfectoral du 8 août 2013:
  - *Définition des prescriptions techniques et environnementales*
  - *Mesures particulières liées à la présence d'espèces protégées*
- Déplacement d'espèce protégée (Renouée Maritime)
  - *Arrêté Préfectoral du 2 juillet 2014*


### *Marchés de travaux :*

- *2 lots : « Terrassement-Génie civil maritime » et « Pontons »*
- *Notifications en date du 24 juillet 2014*


## Planification des travaux :

- Préparation et travaux préalables :
  - Déplacement de la Renouée Maritime : début octobre 2014
  - Préparation de 3 mois contractuels : août-septembre-octobre 2014
- Travaux de terrassement et génie civil maritime : 7 mois
  - Novembre 2014 à Mai 2015
    - Dragage : décembre 2014 à février 2015 (conforme à l'AP)
    - Rideau de palplanches : novembre 2014 à avril 2015
    - Pieux / Digue et terre-plein : mars à mai 2015
- Pontons : 3 mois
  - Mai à juillet 2015 (mise à disposition des 1<sup>ers</sup> pontons mi juin 2015)

# Phasage des travaux :

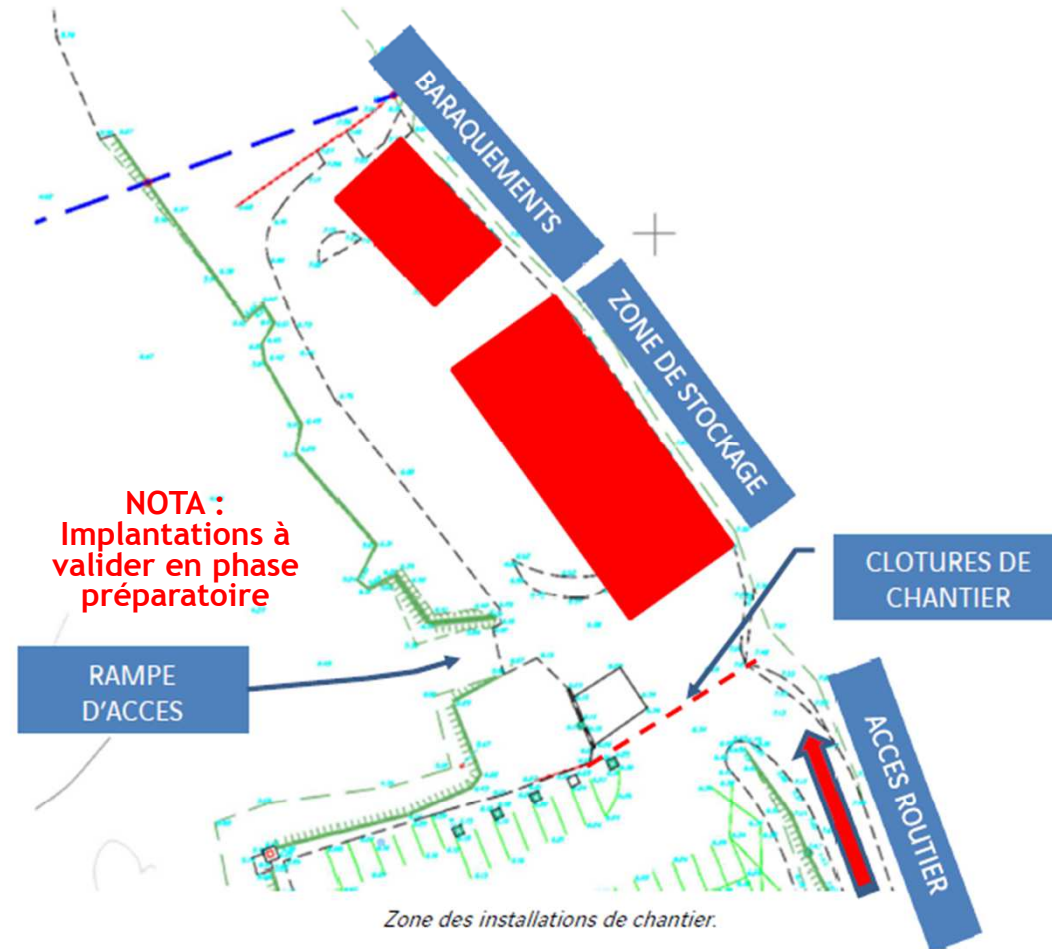

# Phasage des travaux :

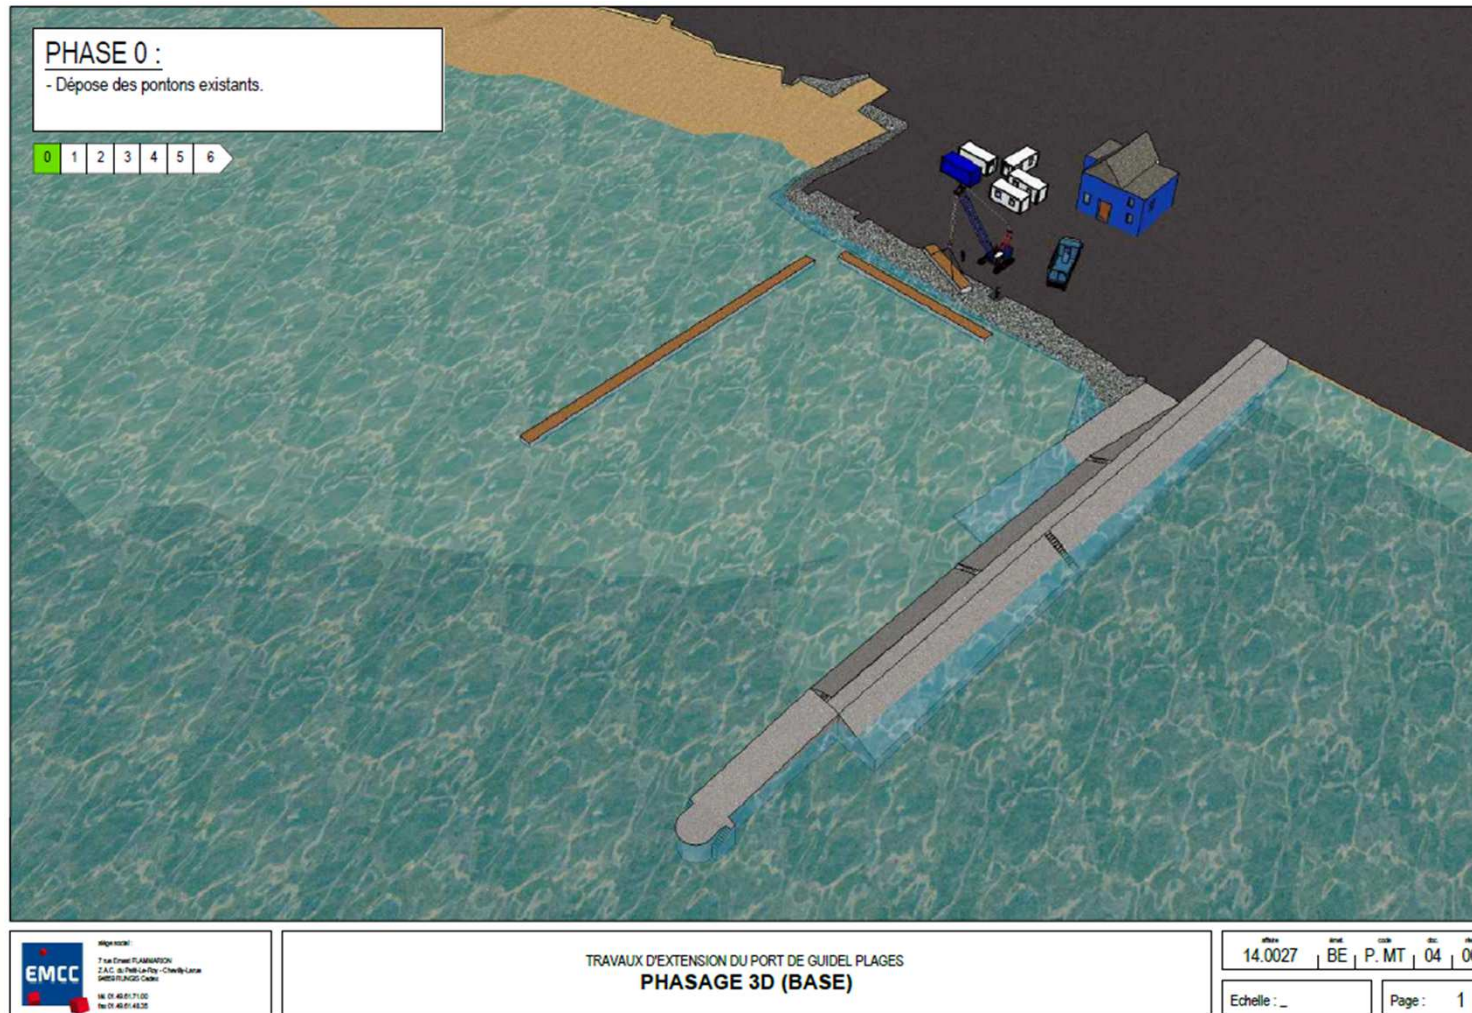

# Phasage des travaux :

**PHASE 1 :**  
- Prédécoupage du terrain pour future mise en place du rideau de palplanches,  
- Battage terrestre des palplanches.

0 1 2 3 4 5 6

The image shows a 3D perspective view of a construction site. A large blue crane is positioned on a red tracked platform, lifting a long, vertical sheet pile. The ground is brown and uneven, with a blue truck visible in the background. A worker in an orange safety vest is standing near the base of the sheet pile. A smaller inset image shows a close-up of a blue tracked machine with a vertical shaft, likely used for soil compaction or driving sheet piles, with two workers in orange safety vests nearby.

|         |    |       |    |    |
|---------|----|-------|----|----|
| 14.0027 | BE | P. MT | 04 | 00 |
|---------|----|-------|----|----|

Echelle : \_ Page : 2

EMCC  
7 rue Ernest FLAMMARION  
Z.I.C. de Ploëz-Les-Hay - Chevilly-Larue  
94555 Chevilly-Centre  
Tel 01 45 61 71 00  
Fax 01 45 61 43 35

TRAVAUX D'EXTENSION DU PORT DE GUIDEL PLAGES  
**PHASAGE 3D (BASE)**



# Phasage des travaux :

**PHASE 2 :**  
- Battage nautique des palplanches.


0 1 2 3 4 5 6

**EMCC**  
Société  
7 rue Ernest FLAMMARION  
Z.A.C. de Poul-Lac'h - Chevilly-Larae  
56510 PLOUZANNE  
Tel 02 98 01 71 00  
Fax 02 98 01 43 35


TRAVAUX D'EXTENSION DU PORT DE GUIDEL PLAGES  
**PHASAGE 3D (BASE)**

14.0027 | BE | P. MT | 04 | 00  
Echelle : \_ | Page : 3

# Phasage des travaux :

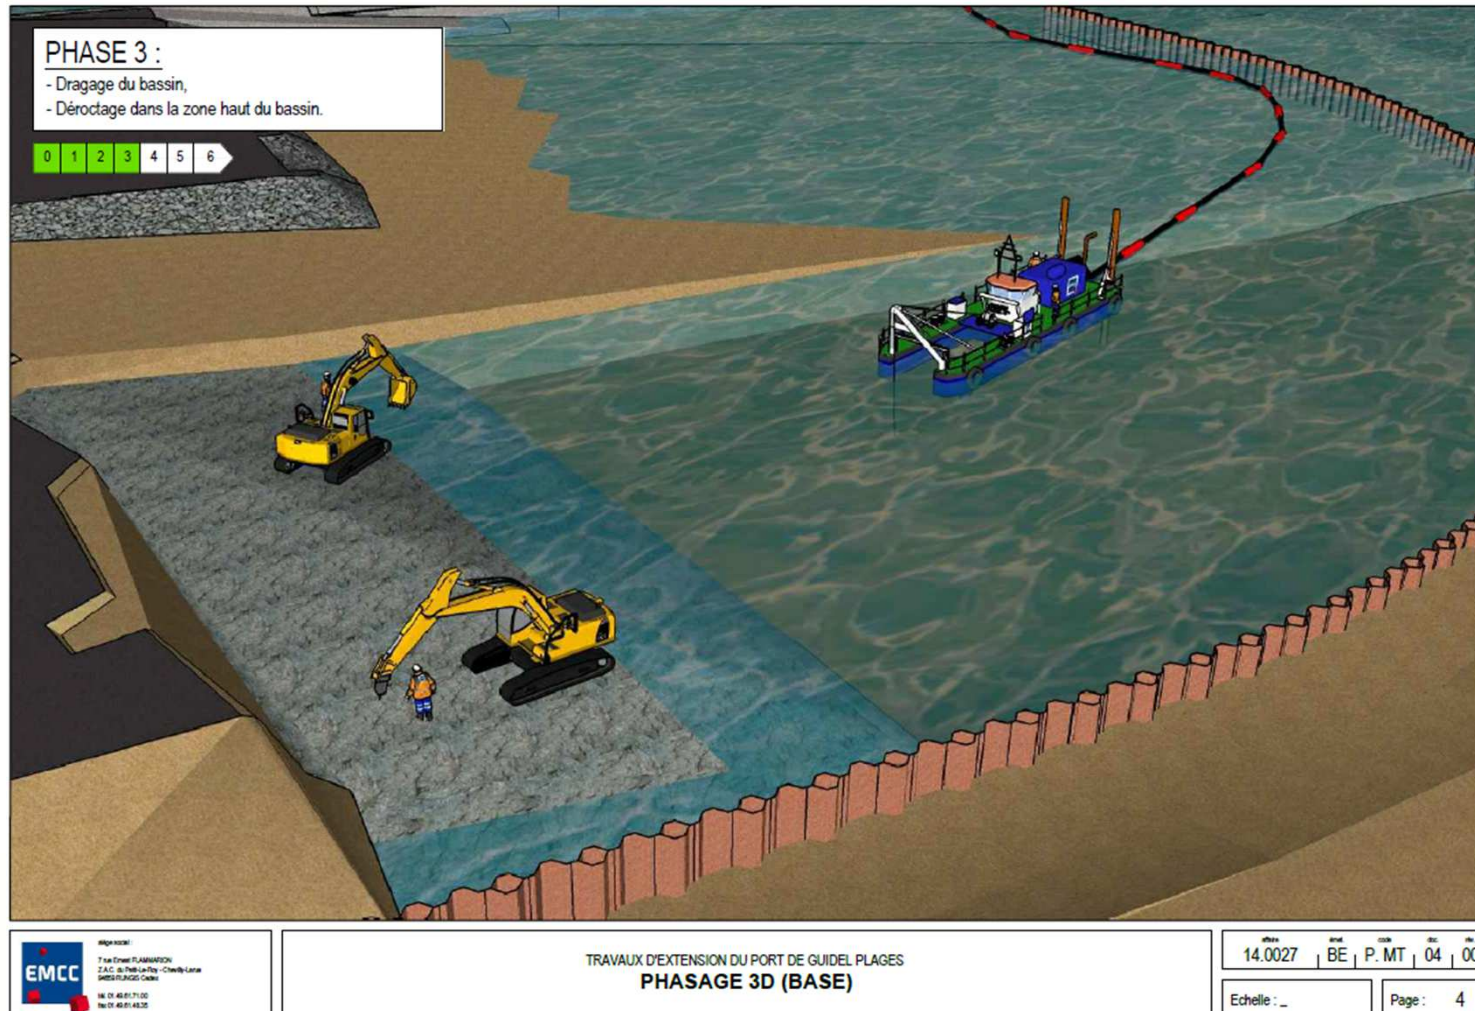

# Phasage des travaux :

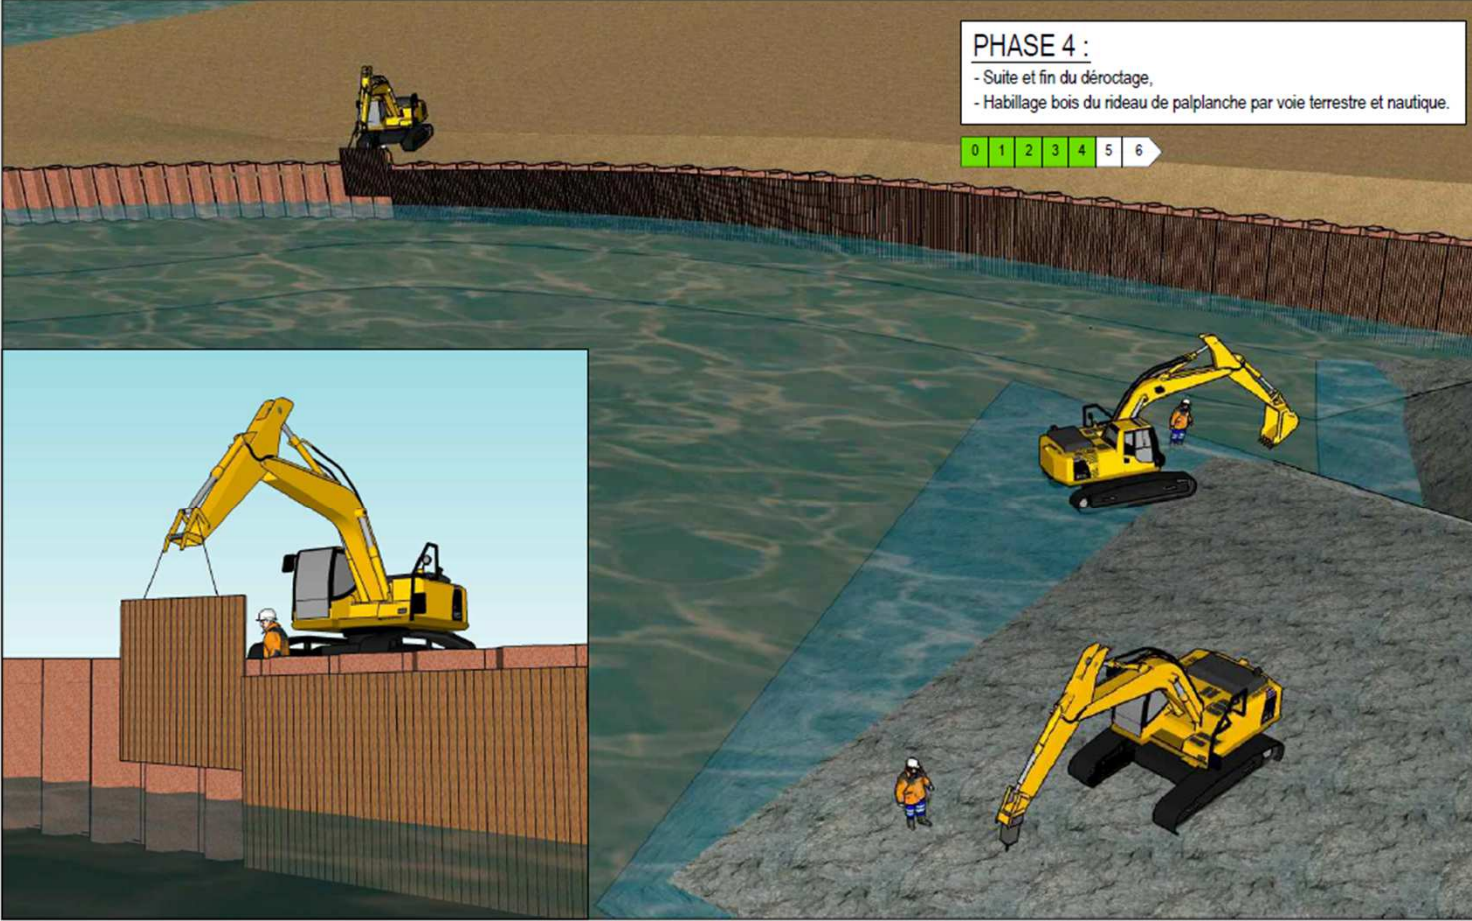

**PHASE 4 :**

- Suite et fin du déroctage,
- Habillage bois du rideau de palplanche par voie terrestre et nautique.

0 1 2 3 4 5 6


**EMCC**  
0494 03381  
7 rue Ernest FLAMMARION  
Z.A.C. de Pabu-Les-Plages - Chevilly-Larue  
94510 LES PLAGES Cedex  
Tel : 01 48 01 71 00  
Fax : 01 48 01 43 32

TRAVAUX D'EXTENSION DU PORT DE GUIDEL PLAGES  
**PHASAGE 3D (BASE)**

|         |    |       |    |    |
|---------|----|-------|----|----|
| 14.0027 | BE | P. MT | 04 | 00 |
|---------|----|-------|----|----|

Echelle : \_ Page : 5

# Phasage des travaux :



**PHASE 5a :**

- Mise en place terrestre du couronnement béton préfabriqué,
- Remplissage béton des préfabriqués.

0 1 2 3 4 5 6

EMCC  
18 03 46 01 71 00  
18 03 46 01 43 00

TRAVAUX D'EXTENSION DU PORT DE GUIDEL PLAGES  
**PHASAGE 3D (BASE)**


|         |    |       |    |    |
|---------|----|-------|----|----|
| 14.0027 | BE | P. MT | 04 | 00 |
|---------|----|-------|----|----|

Echelle : \_ Page : 6

# Phasage des travaux :

**PHASE 5b :**  
- Mise en place nautique du couronnement béton préfabriqué,  
- Remplissage béton des préfabriqués.

0 1 2 3 4 5 6

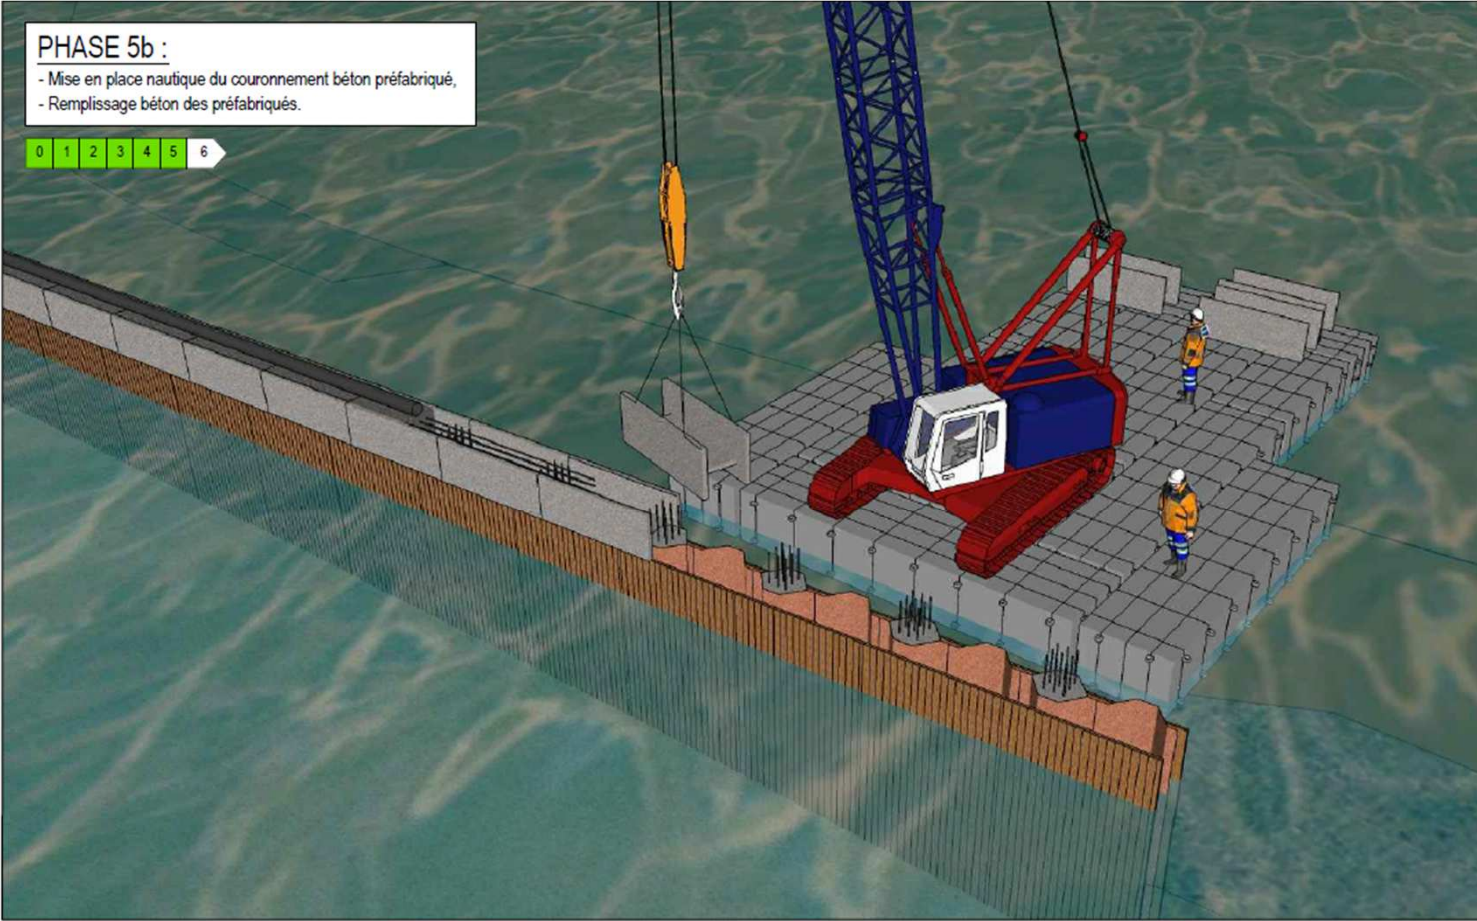


**EMCC**  
1894 0001  
7 rue Ernest FLAMMARION  
Z.A.C. de Pêch'La-Roy - Chevilly-Larae  
94013 FLANGS Cedex  
Tel : 01 49 61 71 00  
Fax : 01 49 61 43 35

TRAVAUX D'EXTENSION DU PORT DE GUIDEL PLAGES  
**PHASAGE 3D (BASE)**

|         |    |       |    |    |
|---------|----|-------|----|----|
| 14.0027 | BE | P. MT | 04 | 00 |
|---------|----|-------|----|----|


Echelle : \_ Page : 7

# Phasage des travaux :



**PHASE 6 :**  
- Mise en place des enrochement du talus et du môle,  
- Battage des pieux guides des futurs pontons.

0 1 2 3 4 5 6

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>EMCC<br/>7 rue Ernest FLAMMARION<br/>Z.I.C. du Parc de la Rivière - Chevilly-Larue<br/>94510 Sceaux<br/>Tel 01 40 61 71 00<br/>Fax 01 40 61 43 30</p> | <p>TRAVAUX D'EXTENSION DU PORT DE GUIDEL PLAGES<br/><b>PHASAGE 3D (BASE)</b></p> | <p>14.0027   BE   P. MT   04   00</p> <p>Echelle : _   Page : 8</p> |
|--|--|---|

# Merci de votre attention.



(Basse mer de coef 45 ou mi-marée de coef 95) hauteur d'eau 2m au dessus du 0 cotes marines :  
rideau d'enclosure submersible visible sur 2m environ



(coef 95) hauteur d'eau : 5,15m au dessus du 0 cotes marines - rideau d'enclosure submersible invisible.
